

הנדון בית ספר קורצאק בדיקת דליפות מים מגג המבנה.

על רקע של אירועי הגשם האחרונים ודליפות מים מגג בית הספר, היום בשעה 08:30 בוצע בדיקה של שלי, קבלן האיטום, ונציגות ההורים לבחינת מצב האיטום בגג.

הממצאים –

א. במבנה האגף החדש ישנם מזילות משני מקורות:

1. החנות הקיימים בגג -




הפתרון המוצא – הוא הפעלת איש מקצוע ייעודי (זגג) לאיטום הרווח בין החלונות למשקוף ולסגור חלונות בעת סופה.

2. כשל של האיטום בנקודת חיבור של המזגן- (יש לציין שחלק של האגף החדש לא טופל במהלך האיטום בשל המלצת היועץ).



הפתרון המומלץ לבצע איטום כולל גם על האגף החדש.

3. ישנה דם נזילה של מים באגף הישן - נדרש תיקום באיטום.
 4. נצפו חלקי מערכת שלא מעוגנים על פני הגג – הנושא טופל במיידע"י נציג שחר אנרגיה אשר אסף את הציוד וקשר לחבילות מסודרות ומעגנות.
 5. ישנם סמני נזיל מים באגף החדש באזורים של תאורה ונקודות חשמל נדרש הנושא בטיפול ממונה בטיחות של אגף החינוך
- לסיום –
1. נדרש לבצע איטום גם על האזורים שקודם הוגדר כתקנים ע"י היועץ.
 2. יש להנחות בשנית עת קבלן הביצוע על האופן בו הגגות נשארים בגמר יום עבודה.
 3. בגגות אש טופלו ע"י קבלן האיטום לא נמצאו נזילות

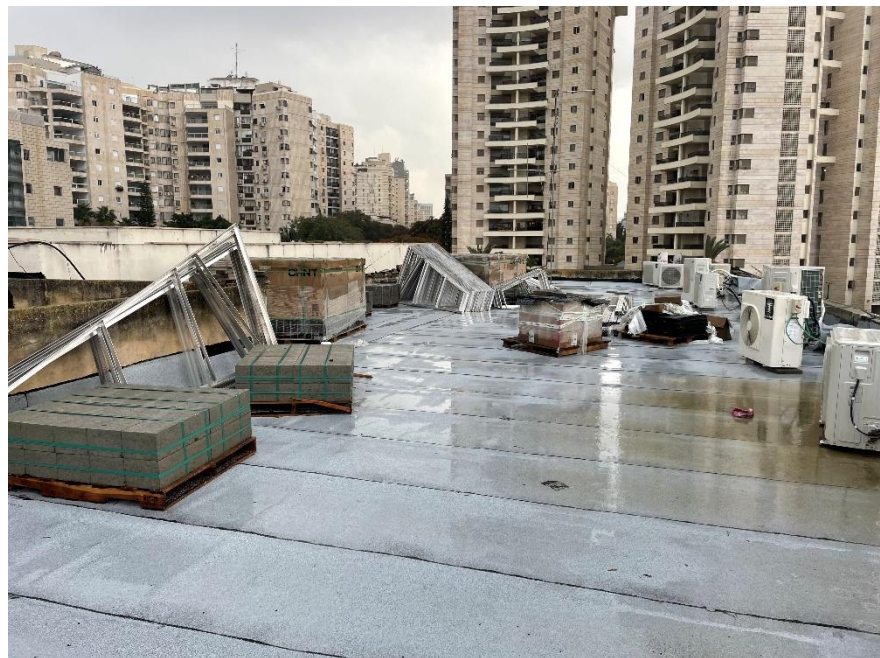

בברכה בני
